
ECRANS DU MENU BUDGET



A. SELECTION CHANTIER

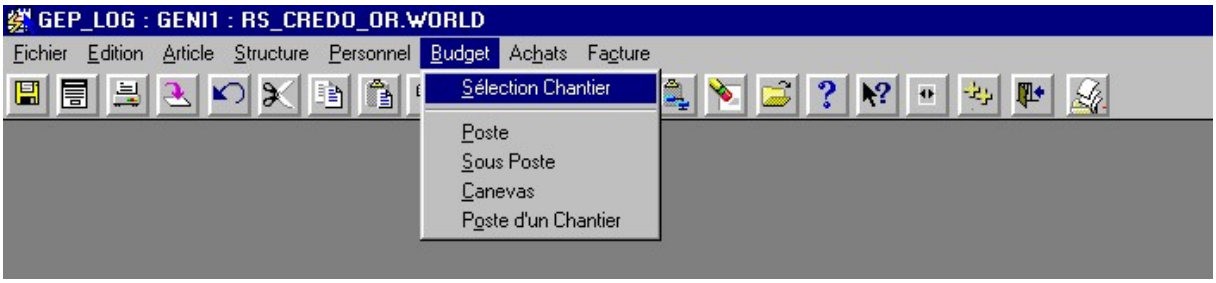

Objet :

Permet de Sélectionner le chantier et d'accéder aux différentes grilles


➔ sélectionner le chantier désiré à partir de son abrégé :

- ⇨ **F4** pour obtenir la liste, le sélectionner dans la liste par "enter" (le numéro apparaît). Valider la sélection par "enter" (le nom du chantier apparaît).
- ⇨ ou taper les 3 premiers caractères du nom principal du chantier, puis valider par "enter.

➔ accéder aux différentes fonctionnalités du budget de chantier à l'aide des boutons numérotés de 0 à 6

- ⇨ 0 : suivi budgétaire
- ⇨ 1 : avancement budget
- ⇨ 2 : fin de chantier
- ⇨ 3 : suivi facturation
- ⇨ 4 : sélection impression
- ⇨ 5 : gestion planning
- ⇨ 6 : diagramme planning

BOUTON 0 : SUIVI BUDGETAIRE

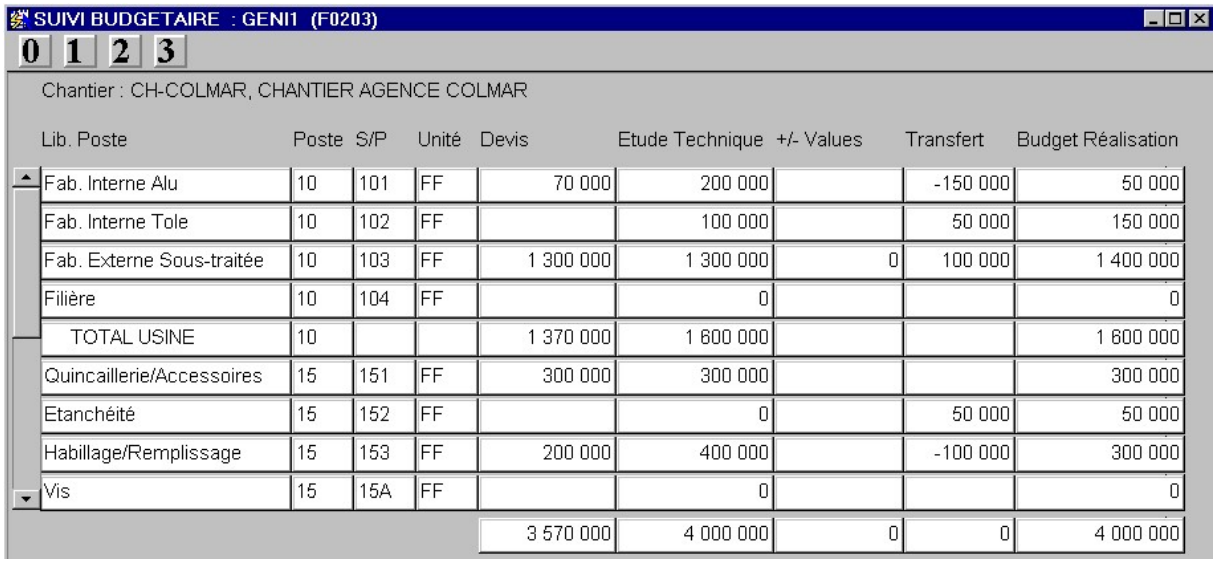
SUIVI BUDGETAIRE : GENI1 (F0203)

0 1 2 3

Chantier : CH-COLMAR, CHANTIER AGENCE COLMAR

Lib. Poste	Poste	S/P	Unité	Devis	Etude Technique	+/- Values	Transfert	Budget Réalisation
Fab. Interne Alu	10	101	FF	70 000	200 000		-150 000	50 000
Fab. Interne Tole	10	102	FF		100 000		50 000	150 000
Fab. Externe Sous-traitée	10	103	FF	1 300 000	1 300 000	0	100 000	1 400 000
Filière	10	104	FF		0			0
TOTAL USINE	10			1 370 000	1 600 000			1 600 000
Quincaillerie/Accessoires	15	151	FF	300 000	300 000			300 000
Etanchéité	15	152	FF		0		50 000	50 000
Habillage/Remplissage	15	153	FF	200 000	400 000		-100 000	300 000
Vis	15	15A	FF		0			0
				3 570 000	4 000 000	0	0	4 000 000

Objet :


Saisir le devis, l'étude technique, les + et - values et les transferts de postes pour obtenir un budget de réalisation destiné à l'analyse à l'avancement et à l'analyse fin de chantier.

1/ Permet de saisir le budget du chantier à travers les colonnes devis, étude technique en **valeurs** et/ou en **quantité d'unités d'oeuvres.**

La saisie de l'étude technique prime toujours sur le devis, il est donc impératif de faire la première saisie dans la colonne devis en attendant que l'étude technique soit réalisée.

➔ pour ***saisir*** un budget dans ces colonnes

⇨ Se placer sur la colonne concernée, puis cliquer sur le **bouton 2** "ajout groupé".

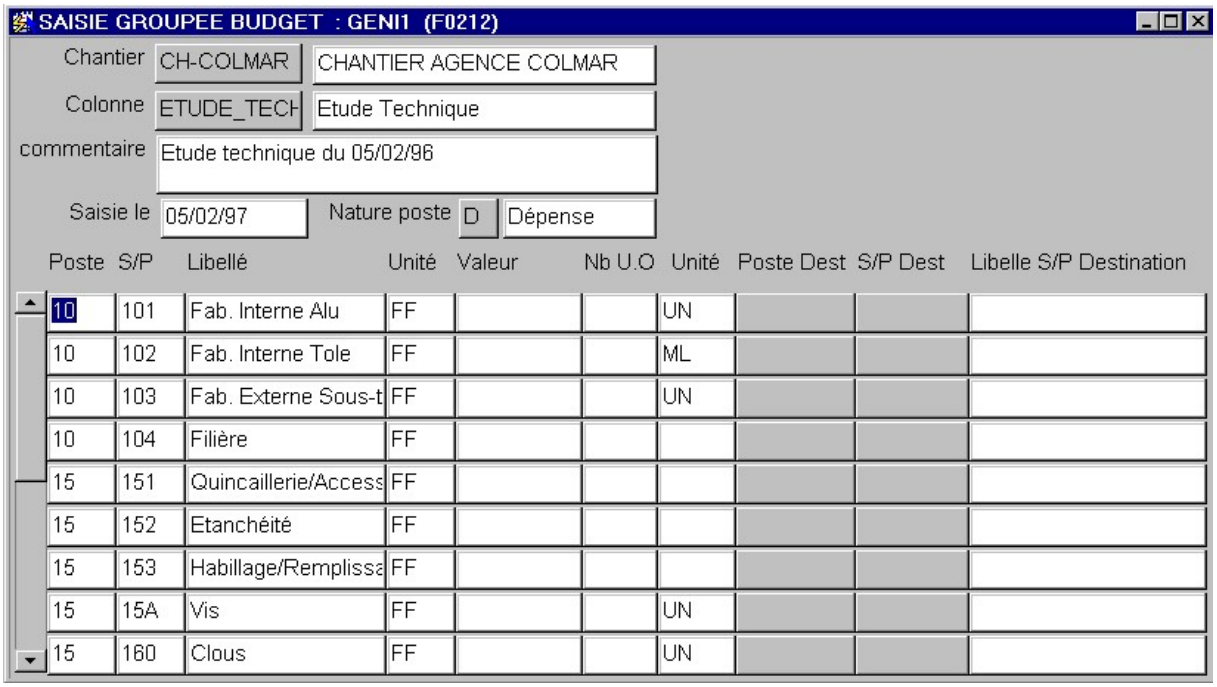
SAISIE GROUPEE BUDGET : GENI1 (F0212)

Chantier CH-COLMAR CHANTIER AGENCE COLMAR

Colonne ETUDE_TECH Etude Technique

commentaire Etude technique du 05/02/96

Saisie le 05/02/97 Nature poste D Dépense

Poste	S/P	Libellé	Unité	Valeur	Nb U.O	Unité	Poste Dest	S/P Dest	Libelle S/P Destination
10	101	Fab. Interne Alu	FF			UN			
10	102	Fab. Interne Tole	FF			ML			
10	103	Fab. Externe Sous-t	FF			UN			
10	104	Filière	FF						
15	151	Quincaillerie/Access	FF						
15	152	Etanchéité	FF						
15	153	Habillage/Remplissa	FF						
15	15A	Vis	FF			UN			
15	160	Clous	FF			UN			

⇨ Rentrer un commentaire puis **"enter"**
⇨ Entrer une date de mise à jour. Par défaut on a la date du jour (modifiable).
⇨ Taper deux fois **"enter"** .
⇨ Saisir les valeurs en devises et en unités d'œuvres.
⇨ Taper **F5** pour valider
⇨ Taper deux fois **F3** pour sortir de la grille

➔ pour ***modifier*** un budget déjà saisi :


⇨ Se placer sur la colonne concernée puis cliquer sur le **bouton 2** "ajout groupé".
⇨ Modifier les valeurs en devises et en unité d'œuvre uniquement sur le sous-poste concerné.
⇨ Valider par **F5**
⇨ Taper deux fois **F3** pour sortir

Les sous-postes sur lesquels on ne resaisit rien reprennent automatiquement la précédente valeur saisie.

2/ Permet de saisir et de modifier des plus ou moins values.

➔ pour ***saisir*** une + ou - value :

⇨ Se placer dans la colonne +/- value et sur la ligne voulue, puis cliquer sur le **bouton 1** "détail des saisies".
Saisir la valeur en devises dans le champs "Valeur" et la valeur en unités d'oeuvres dans le champs "Nb U.O.".
⇨ Valider par F5.
⇨ Taper deux fois **F3** pour sortir de la grille.

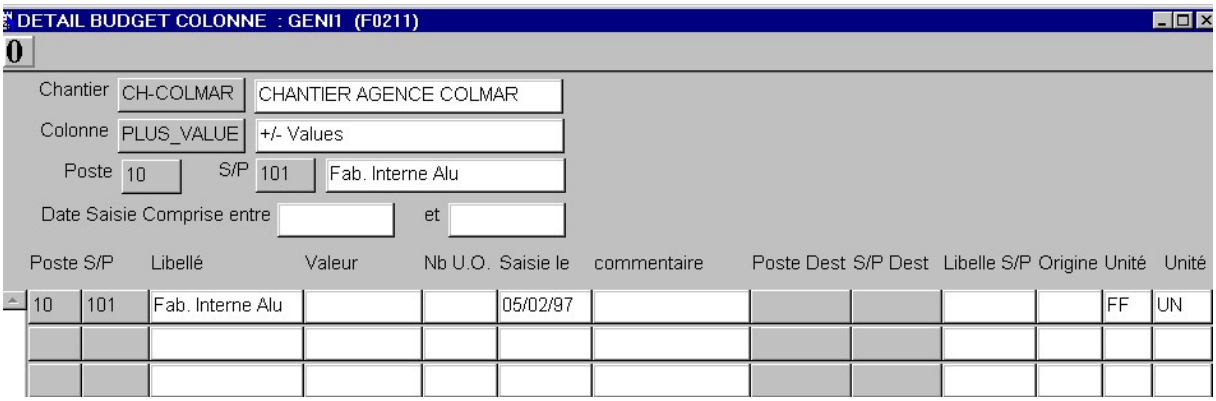

➔ pour ***modifier*** un budget déjà saisi :

⇨ Se placer sur la colonne concernée, puis cliquer sur le **bouton 1** "détail des saisies".
⇨ Saisir les valeurs en devises et en unités d'oeuvres et annuler la précédente ligne saisie en la mettant à 0 (sauf si les montants de plus ou moins values doivent se cumuler).
⇨ Taper **F5** pour valider.
⇨ Taper deux fois **F3** pour sortir de la grille.

3/ Permet de transférer des budgets d'un sous-poste à un autre sous poste

➔ pour ***saisir*** un transfert (en gardant l'historique) :

- ⇨ Se placer sur la colonne transfert, puis cliquer sur le **bouton 2** "ajout groupé".
- ⇨ Entrer la valeur à transférer, sur la ligne correspondant au sous-poste d'origine (ex : fabrication interne).
- ⇨ Choisir le poste et le sous-poste destination (ex : fabrication externe sous-traitée) grâce à **F4** (liste).
- ⇨ Valider par **F5**
- ⇨ Taper deux fois **F3** pour sortir.

(exemple : 100 000F de profilés aluminium qui devaient être fabriqués dans nos usines (sous poste fabrication interne aluminium) sont finalement sous-traités (sous poste fabrication externe sous-traitée) au fournisseur Fourni-alu.

Rappel : La somme des transferts est toujours nulle.

➔ pour ***modifier*** un transfert :

- ⇨ Se placer sur la colonne transfert et sur la ligne concernée, puis cliquer sur le **bouton 1** "détail saisie".
- ⇨ Entrer la valeur à transférer, sur la ligne correspondant au sous-poste d'origine (ex : fabrication interne).
- ⇨ Choisir le poste et le sous-poste destination (ex : fabrication externe sous-traitée) grâce à **F4** (liste).
- ⇨ Valider par **F5.**
- ⇨ Taper deux fois **F3** pour sortir.

3/ Permet d'éditer le suivi budgétaire et de le consulter en global et/ou par poste.


➔ Pour ***éditer*** :

- ⇨ Cliquer sur le **bouton 3** "édition suivi budgétaire".
- ⇨ Attendre l'Aperçu avant impression.
- ⇨ Cliquer sur "Print "pour imprimer ou "Close" pour fermer.

➔ Pour ***consulter*** :

- ⇨ se positionner sur le sous-poste.
- ⇨ cliquer sur bouton 1 "Détail des saisies".

BOUTON 3 : SUIVI FACTURATION

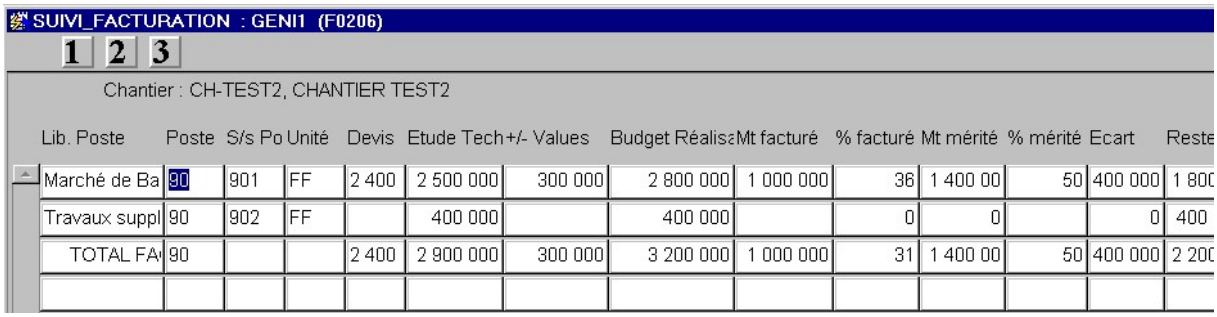


Objet :

Définir la facturation marché devis/étude technique/ avancement et fin de chantier.

1/ Permet de rentrer le montant marché du devis, de l'étude technique, et des +/- values.

➔ pour ***saisir*** :

- ⇨ Se positionner sur la colonne appropriée, cliquer sur le **bouton 2** "ajout groupé".
- ⇨ Rentrer le montant dans le champs "Valeur".
- ⇨ Valider par F5 puis quitter par 2 fois F3.

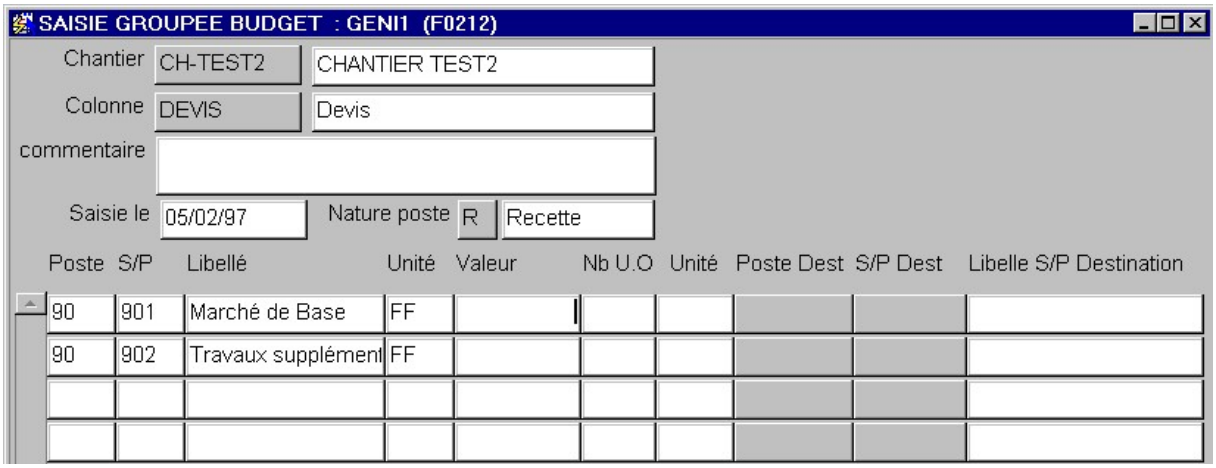

➔ pour ***modifier***

- ⇨ Idem saisie

2/ Permet de rentrer le montant facturé au client (en cumulé) lors de l'établissement de la situation mensuelle.


Le % du montant facturé se calcule automatiquement.

➔ pour ***saisir*** la première situation :

- ⇨ se positionner sur la colonne "Mt facturé", cliquer **sur bouton 1** "détail des saisies".
- ⇨ rentrer le montant de la 1ère situation , en indiquant dans le commentaire la date de la situation cumulée.

➔ pour ***modifier*** lors des situations suivantes :

⇨ se positionner sur la colonne facturé, cliquer **sur bouton 1** "détail des saisies".
⇨ entrer le montant cumulé sur une nouvelle ligne, en précisant la nouvelle date et mettre à 0 les lignes précédentes.

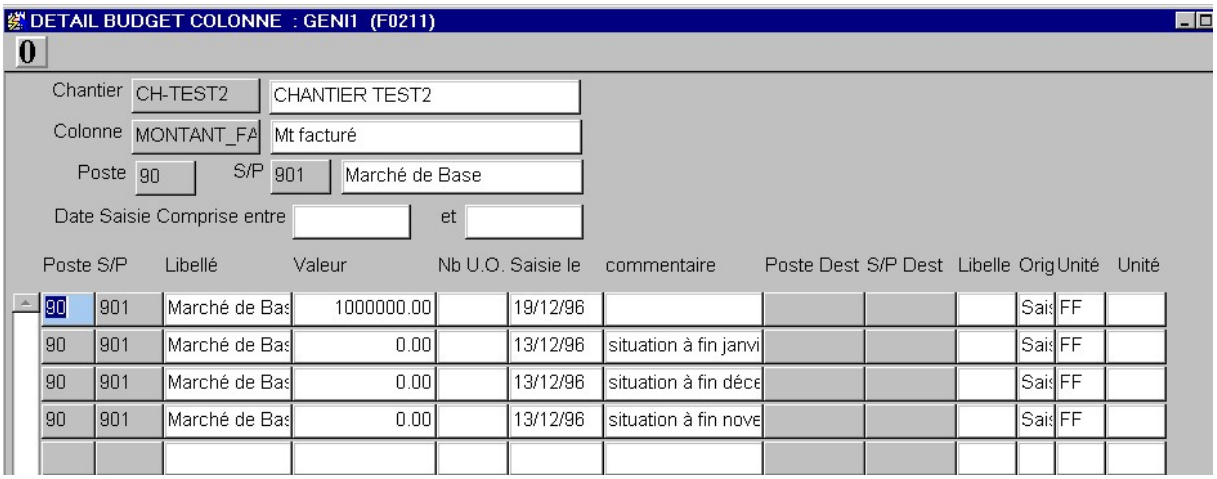

3/ Permet de rentrer **un % de situation méritée.**

Le calcul du % multiplié par le montant marché donne une situation méritée en valeur qui sera reprise dans les tableaux de calcul de marge à l'avancement.

➔ pour ***saisir*** :


⇒ Se positionner sur la colonne % mérité cliquer **sur bouton 2** « ajout groupé »
⇒ Rentrer le % de situation cumulée

➔ pour ***modifier*** lors des situations suivantes :

⇒ Se positionner sur la colonne % mérité, cliquer **sur bouton 2** «ajout groupé».
⇒ Entrer directement le pourcentage du nouvel avancement cumulé mérité.

4/ Permet d'éditer le suivi facturation : cliquer sur le **bouton 3**

BOUTON 1 : AVANCEMENT

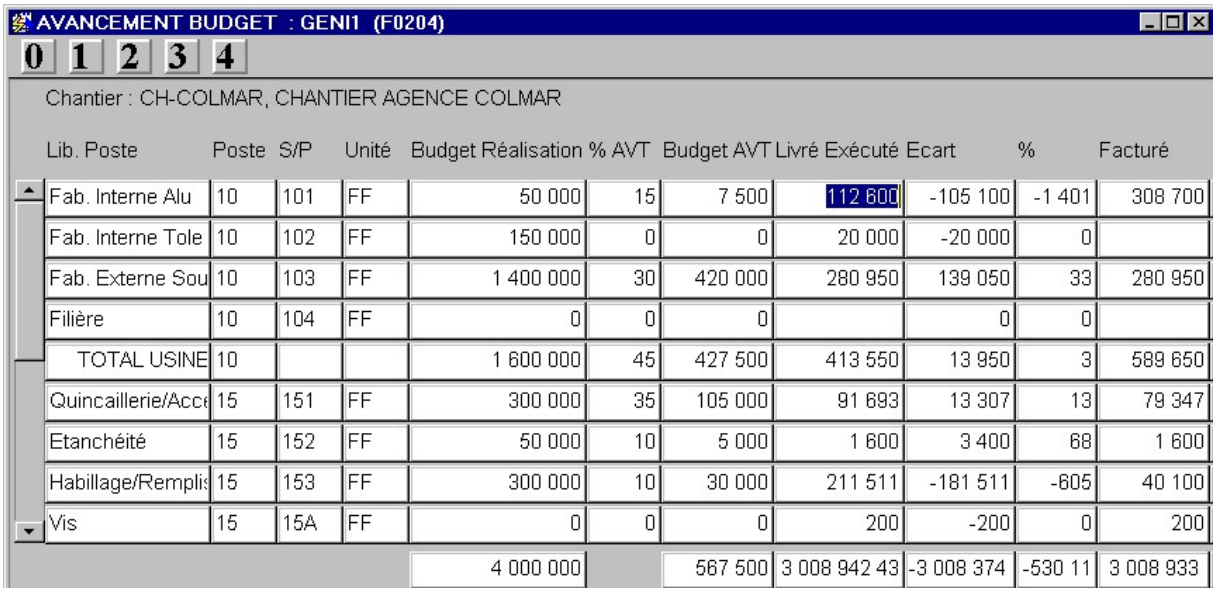
AVANCEMENT BUDGET : GENI1 (F0204)

0 1 2 3 4

Chantier : CH-COLMAR, CHANTIER AGENCE COLMAR

Lib. Poste	Poste	S/P	Unité	Budget Réalisation	% AVT	Budget AVT	Livré Exécuté	Ecart	%	Facturé
Fab. Interne Alu	10	101	FF	50 000	15	7 500	112 600	-105 100	-1 401	308 700
Fab. Interne Tole	10	102	FF	150 000	0	0	20 000	-20 000	0	
Fab. Externe Sou	10	103	FF	1 400 000	30	420 000	280 950	139 050	33	280 950
Filière	10	104	FF	0	0	0		0	0	
TOTAL USINE	10			1 600 000	45	427 500	413 550	13 950	3	589 650
Quincaillerie/Acc	15	151	FF	300 000	35	105 000	91 693	13 307	13	79 347
Etanchéité	15	152	FF	50 000	10	5 000	1 600	3 400	68	1 600
Habillage/Rempli	15	153	FF	300 000	10	30 000	211 511	-181 511	-605	40 100
Vis	15	15A	FF	0	0	0	200	-200	0	200
				4 000 000		567 500	3 008 942 43	-3 008 374	-530 11	3 008 933

Objet :

Permet de comparer la marge brute théorique à l'avancement et la marge réelle à l'avancement méritée.

1/ Permet de définir un % d'avancement spécifique à chaque type de déboursés (sous-poste) et une facturation théorique proportionnelle

➔ pour ***saisir*** un % d'avancement :

⇒ Se positionner sur la colonne "% AVT", cliquer sur **bouton 2** "ajout groupé".
⇒ Entrer les valeurs (exemple 15 pour 15%) (si le sous-poste n'est pas du tout avancé, entrer impérativement 0, car si l'on ne remplit pas la valeur d'un sous-poste, c'est la précédente saisie qui revient)

➔ pour ***modifier*** un % d'avancement sur un ou plusieurs postes :

⇒ Se positionner sur la colonne, cliquer sur **bouton 2** "saisie groupée".
⇒ Ne rentrer une valeur que sur les sous-postes concernés par une modification

➔ la facturation théorique à l'avancement sera calculée automatiquement (c'est le % moyen théorique d'avancement des déboursés qui viendra pondérer la facturation prévisionnelle globale).

2/ Permet de visualiser l'avancement réel des déboursés et la situation méritée du chantier

➔ pour ***Consulter*** l'avancement réel des déboursés :

⇒ se positionner sur la colonne "Livré Exécuté", puis cliquer sur **bouton 1** « détail des saisies ». On ne peut rien saisir dans cette colonne, tout provient de la chaîne achat.

➔ pour ***Consulter*** la situation méritée se reporter au suivi facturation.

3/ Permet d'appréhender l'écart entre les deux types d'avancement et d'en tirer d'éventuelles conséquences sur la marge fin de chantier.


➔ pour ***Editer*** un comparatif des déboursés (budget Avancé - livré Exécuté) :

⇒ Cliquer sur **bouton 3** « Edition avancement budget ».
⇒ Cliquer sur "Print" pour imprimer et "Close" pour fermer.

➔ pour ***Editer*** un comparatif des marges (marge théorique - marge méritée) :

⇒ Cliquer sur **bouton 4** « Edition analyse avancement ».
⇒ Cliquer sur Print pour « imprimer »et « Close » pour fermer.

BOUTON 2 : FIN DE CHANTIER

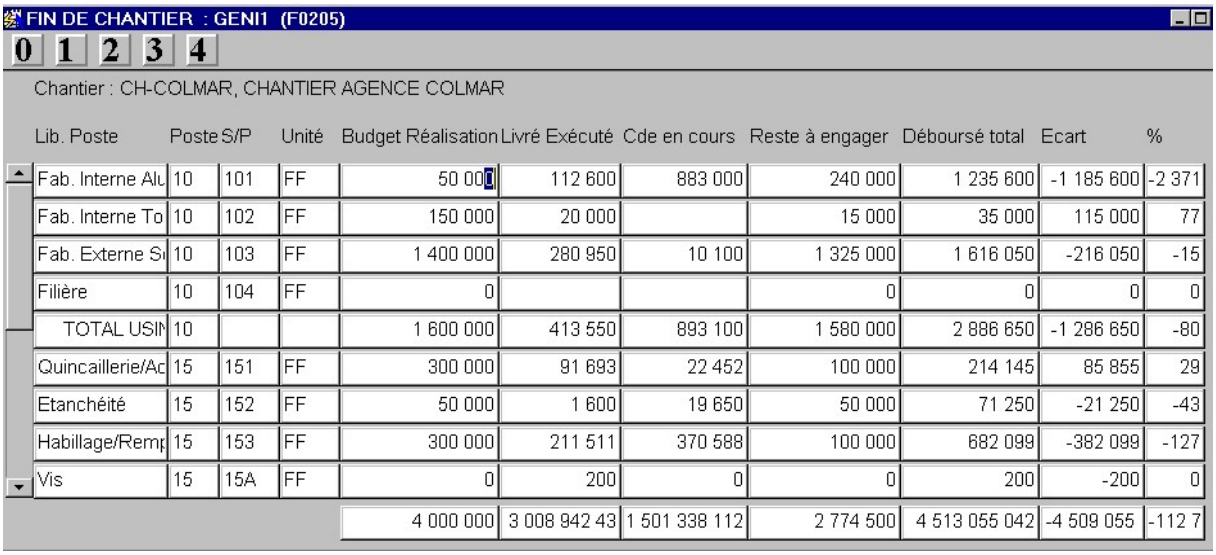

Lib. Poste	Poste	S/P	Unité	Budget Réalisation	Livré Exécuté	Cde en cours	Reste à engager	Déboursé total	Ecart	%
Fab. Interne Alu	10	101	FF	50 00[illegible]	112 600	883 000	240 000	1 235 600	-1 185 600	-2 371
Fab. Interne To	10	102	FF	150 000	20 000		15 000	35 000	115 000	77
Fab. Externe Si	10	103	FF	1 400 000	280 950	10 100	1 325 000	1 616 050	-216 050	-15
Filière	10	104	FF	0			0	0	0	0
TOTAL USIN	10			1 600 000	413 550	893 100	1 580 000	2 886 650	-1 286 650	-80
Quincaillerie/Ac	15	151	FF	300 000	91 693	22 452	100 000	214 145	85 855	29
Etanchéité	15	152	FF	50 000	1 600	19 650	50 000	71 250	-21 250	-43
Habillage/Remp	15	153	FF	300 000	211 511	370 588	100 000	682 099	-382 099	-127
Vis	15	15A	FF	0	200	0	0	200	-200	0
				4 000 000	3 008 942 43	1 501 338 112	2 774 500	4 513 055 042	-4 509 055	-112 7


Objet :

Appréhender une vision des déboursés et de la marge en prévisionnel fin de chantier pour les comparer au budget de réalisation.

1/ Permet de consulter les éléments déjà engagées sur le chantier provenant de la chaîne achat et ne pouvant être saisis directement.

➔ pour ***Consulter*** le "livré - exécuté" :

⇨ se positionner sur la colonne « livré - exécuté », puis cliquer sur **bouton 1** "détail des saisies".

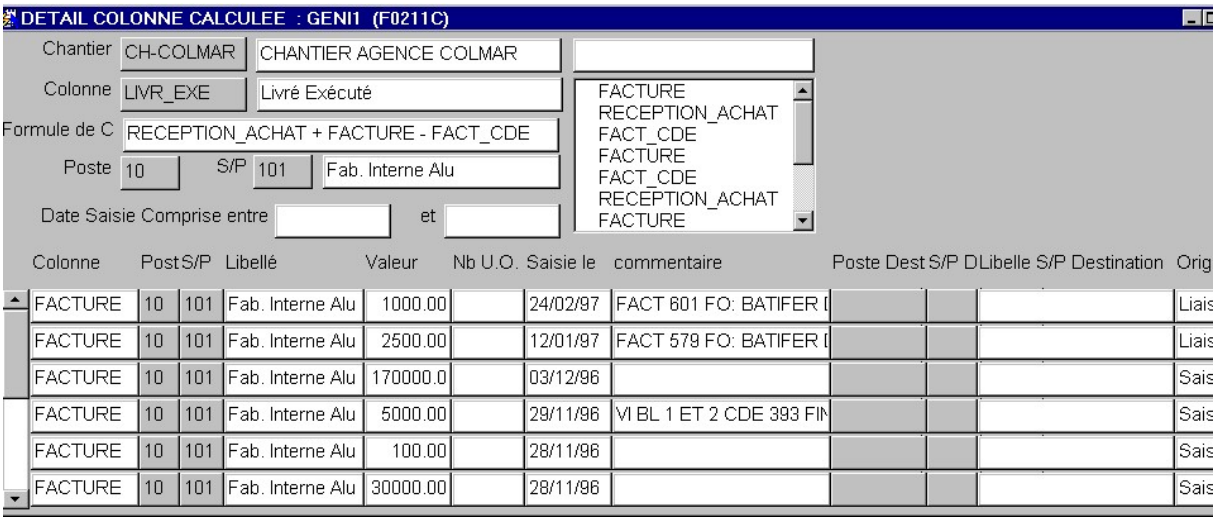

Colonne	Post	S/P	Libellé	Valeur	Nb U.O.	Saisie le	commentaire	Poste Dest	S/P D	Libelle S/P Destination	Orig
FACTURE	10	101	Fab. Interne Alu	1000.00		24/02/97	FACT 601 FO: BATIFER [				Liais
FACTURE	10	101	Fab. Interne Alu	2500.00		12/01/97	FACT 579 FO: BATIFER [				Liais
FACTURE	10	101	Fab. Interne Alu	170000.0		03/12/96					Sais
FACTURE	10	101	Fab. Interne Alu	5000.00		29/11/96	VI BL 1 ET 2 CDE 393 FIN				Sais
FACTURE	10	101	Fab. Interne Alu	100.00		28/11/96					Sais
FACTURE	10	101	Fab. Interne Alu	30000.00		28/11/96					Sais


➔ pour ***Consulter*** les commandes en cours :

⇨ se positionner sur la colonne « commandes en cours », puis cliquer sur **bouton 1** « détail des saisies »

2/ Permet de saisir tous les engagements restant à faire jusqu'à la fin du chantier

➔ Pour ***Saisir*** des montants restant à engager :


- ⇨ se positionner sur le sous-poste désiré, cliquer sur le **bouton 1** "Détail des saisies"
- ⇨ se positionner sur la colonne Valeur et entrer les montants
- ⇨ entrer F5 pour valider puis deux fois F3 pour sortir

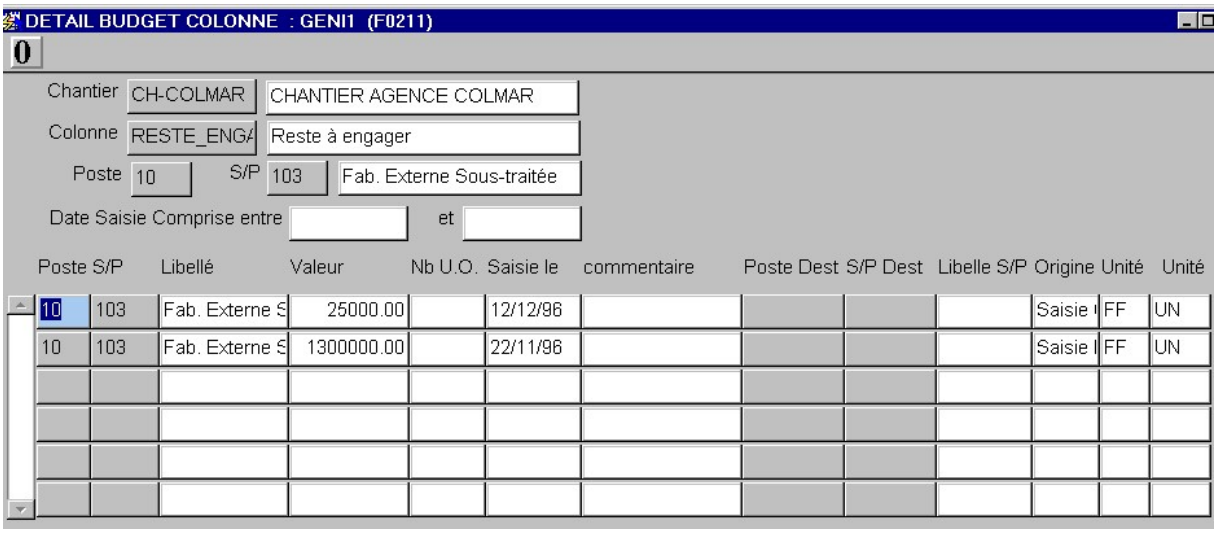

➔ Pour ***modifier*** un montant restant à engager :

- ⇨ se positionner sur le sous-poste désiré, cliquer sur le **bouton 1** "Détail des saisies".
- ⇨ entrer un nouveau montant, nouveau commentaire, nouvelle date sur une nouvelle ligne.
- ⇨ se positionner sur la précédente ligne et supprimer le précédent montant.

BOUTON 4 : SELECTION IMPRESSION

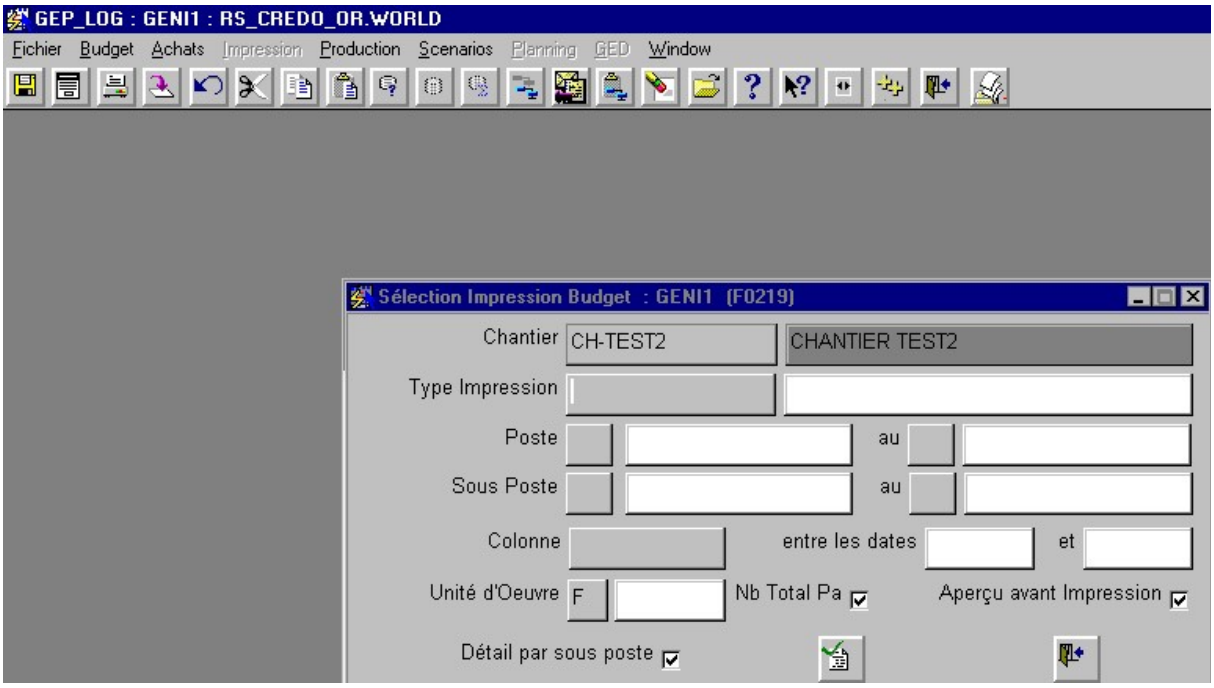


Objet:

Sélection de toutes les impressions en direct sans passer par les différentes grilles et imprimer le détail des colonnes.


➔ Edition des synthèses :

- ⇨ Se positionner sur type d'impression, cliquer sur **F4** liste.
- ⇨ Choisir l'impression **-de Budget 01 à Budget 06-** valider par "enter".
- ⇨ Cliquer sur l'icône d'impression.
- ⇨ Attendre l'Aperçu, cliquer sur « print » puis sur « Close ».

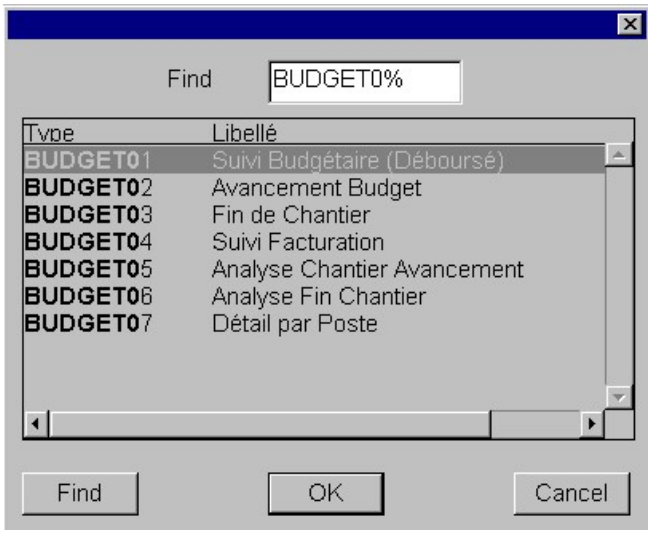


➔ Edition des détails par poste et par colonne

- ⇨ se positionner sur type d'impression, cliquer sur **F4** liste, sélectionner **budget 07**
- ⇨ choisir les postes et les sous-postes (utiliser **F4** liste) (pour sélectionner tous les postes, laisser les zones vierges)
- ⇨ choisir la colonne (**F4** liste)

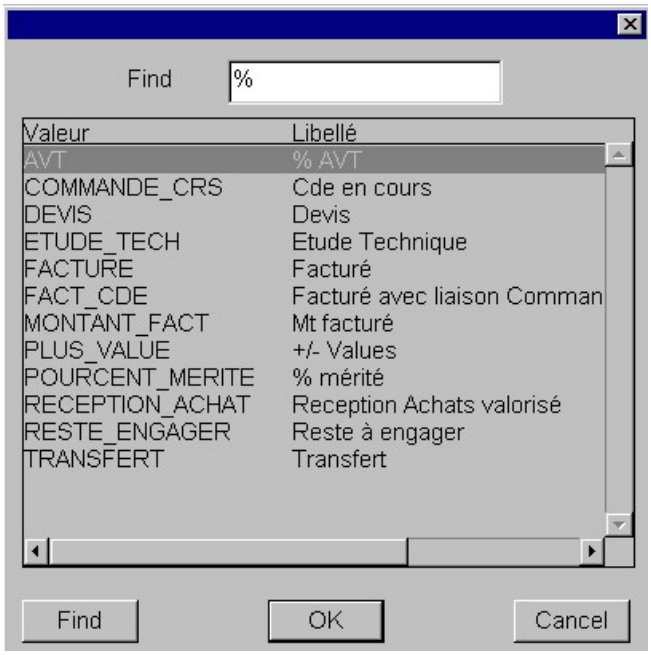

- ⇨ choisir les dates de bornage (laisser la date vierge pour obtenir l'édition depuis le début du chantier)
- ⇨ choisir les unités d'œuvre si différentes de celle proposée par défaut(en FF par défaut)
- ⇨ nombre total de pages coché par défaut pour préparation et édition de la totalité des pages (Si décoché, la préparation se fait page à page)
- ⇨ aperçu avant impression coché par défaut
- ⇨ détail par sous-poste coché par défaut

B. POSTE D'UN CHANTIER

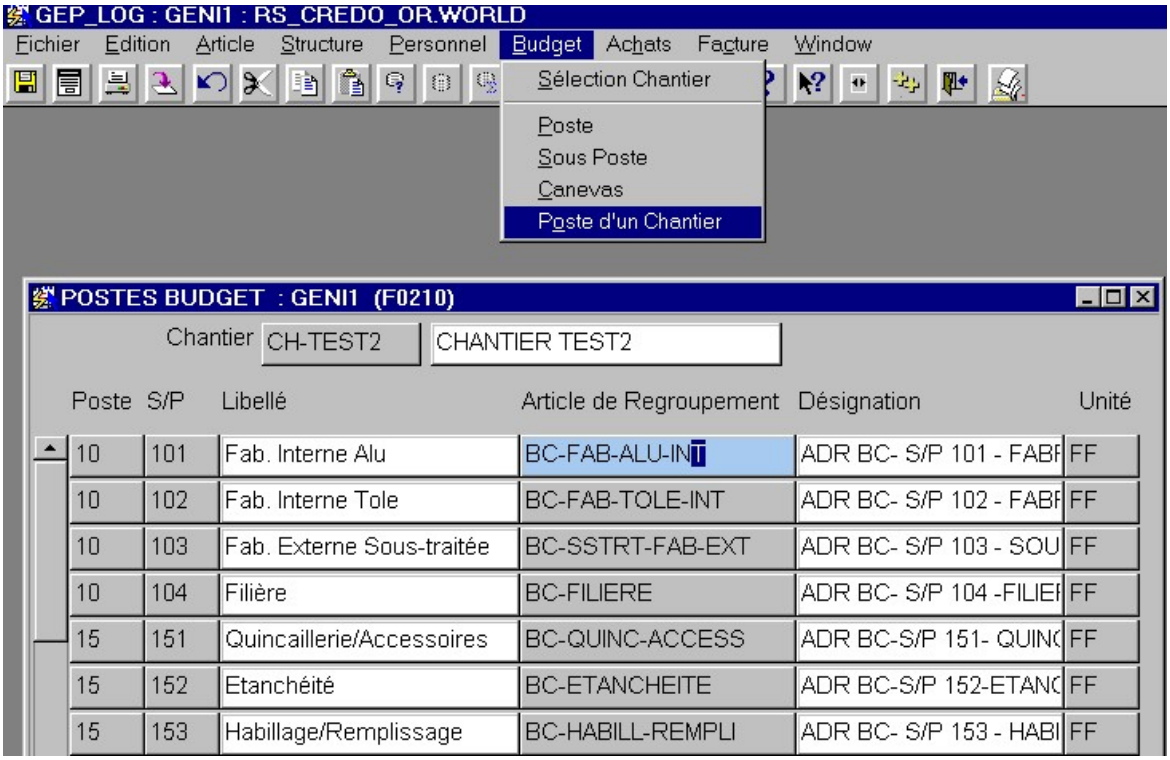

Objet :

Créer un ou des sous-postes supplémentaires spécifiques à un chantier pour permettre le suivi précis des engagements de dépenses d'un type particulier.


- ⇨ Se placer sur une ligne et faire F7 pour insérer une ligne.
- ⇨ Saisir un numéro de poste (existant) et un numéro de sous-poste (à créer).
  Il est important de respecter la racine du poste en créant le sous-poste, pour faciliter le regroupement par type de déboursés (ex : racine 20 pour les achats externes regroupant les sous-postes 201 vitrages, 202 stores, . . . etc).
  Exemple : pour créer le sous-poste marbre qui est un achat externe, on affectera par exemple le sous-poste 204 rattaché à la racine 20.

La suppression d'un poste ou d'un sous-poste (taper Shift F12) n'est possible que s'il n'y a aucun enregistrement sur ce poste.

⇨ Ne rien saisir dans la colonne "ADR" pour un sous-poste spécifique à un chantier.
⇨ F5 pour valider.
⇨ F3 pour quitter.

CREATION D'UN CHANTIER

Transaction ouverte uniquement aux personnes autorisées à créer des structures

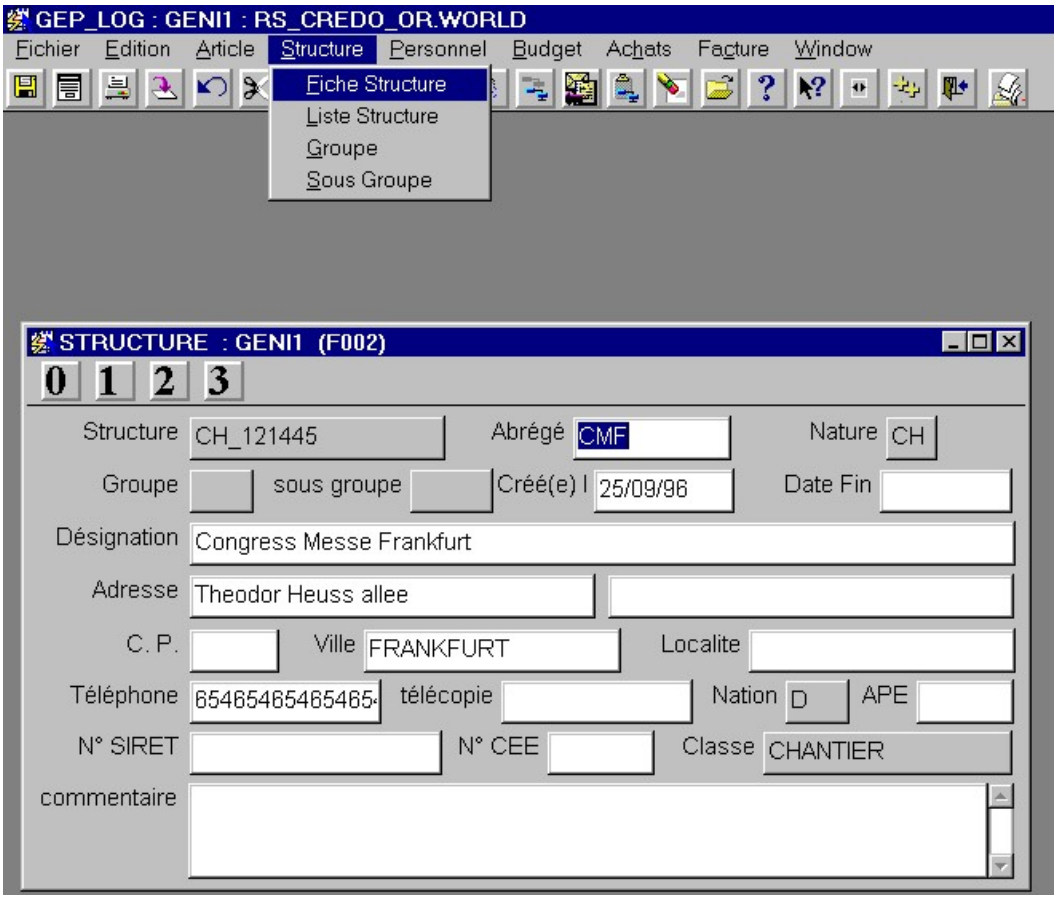

⇨ Structure : rentrer "CH-" (code nature structure chantier) suivi du numéro de chantier (6 caractères). Exemple : *CH-120651*

⇨ Abrégé : les six premiers caractères du nom principal. En cas de nom composé l'abrégé est constitué des 3 premiers caractères du premier nom et des 3 premiers caractères du deuxième. S'il y a un sigle défini pour le chantier on le reprend dans l'abrégé (ex : CMF).

⇨ Nature : "CH" obligatoire pour le chantier (F4 liste).

⇨ Structure : la date se met automatiquement sur celle du jour, pour la changer, taper une nouvelle date.

⇨ Désignation : entrer le nom complet du chantier.

⇨ Adresse / CP / ville / Localité / Télécopie : à compléter.

⇨ Nation : F4 pour obtenir la liste.

⇨ Classe : Chantier obligatoire (F4 liste).

⇨ Groupe / Sous-Groupe : ne rien indiquer.

Bouton 0 : Propriétés

Les propriétés correspondent aux caractéristiques de la structure.

- ⇨ Entrer les "propriétés" sur la zone valeur en respectant le "type" (nombre, caractères...etc).
- ⇨ Valider par **F5** après chaque saisie.
- ⇨ Taper **F3** pour sortir.

Bouton 2 : Suivi Budgétaire

Permet de créer les postes et sous-postes du chantier qui serviront au suivi budgétaire à partir d'un canevas (minimum de postes et sous-postes obligatoires).

⇨ "Créer poste, sous-poste à partir d'un canevas ? Oui/non ?"
Répondre oui.
⇨ CHA Budget Chantier
Cliquer sur OK.

⇨Une liste de postes (2 caractères alphanumériques) et de sous-postes (3 caractères) apparaîssent. Les sous-postes indiqués dans le canevas minimum sont tous liés à un Article de Regroupement (ADR).
